



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Fondo Hídrico: obras paradas y plata en Letras

Ejecución del FFIH y riesgo frente a El Niño
OCTUBRE 2026



Email
prensa@centrocepa.com.ar



Web
<https://centrocepa.com.ar/>



Redes sociales
[@ctrocepa](#)

Situación general

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), creado por el Decreto 1381/01, se financia con el 4,31% del impuesto a los combustibles y tiene por objeto la ejecución de obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas. Es, por lo tanto, la principal herramienta nacional para enfrentar los eventos hídricos extremos, en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fenómeno de El Niño fuerte y en intensificación para el último trimestre de 2026.

De las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo, **15 fueron canceladas o suspendidas** (13 con convenio rescindido y 2 neutralizadas), 8 continúan en ejecución y solo 1 figura como finalizada. Las obras paralizadas suman contratos por \$144.818 millones, el 39,7% del monto total de la cartera, y 7 de ellas se ubican en el conurbano bonaerense. Las que siguen en ejecución concentran \$219.573 millones, aunque con niveles de avance muy bajos: ninguna supera el 36%.

Tabla 1. Estado de las 24 obras iniciadas con financiamiento del FFIH. Monto de contrato actualizado en millones de pesos.

Estado	Cantidad de obras	Monto de contrato	% del monto
Convenio rescindido	13	11.873	3,3%
Neutralizada	2	132.945	36,4%
En ejecución	8	219.573	60,2%
Finalizada	1	423	0,1%
Total	24	364.814	100%

Fuente: CEPA en base a SIPPE.

Las 24 obras

La cartera combina obras de gran escala, como el Acueducto San Javier–Tostado en Santa Fe (\$128.970 millones) y la ampliación del Río Salado en la provincia de Buenos Aires (\$163.131 millones entre sus tres subtramos), con un conjunto de obras pluviales urbanas de menor monto en el conurbano y en distintas provincias. La Tabla 2 detalla cada una de ellas, su localización, su estado y el avance informado.

Tabla 2. Obras iniciadas con financiamiento del FFIH. Monto de contrato actualizado en millones de pesos.

N°	Obra	Ubicación	Estado	Monto	Avance
1	Acueducto San Javier–Tostado	San Javier-Tostado, Santa Fe	Neutralizada	128.970	90,0%
2	Ampliación Río Salado, Tramo IV Etapa II (subtramo C)	Roque Pérez, Buenos Aires	En ejecución	75.694	18,8%

N°	Obra	Ubicación	Estado	Monto	Avance
3	Ampliación Río Salado, Tramo IV Etapa II (subtramo A)	Roque Pérez, Buenos Aires	En ejecución	47.529	0,0%
4	Ampliación Río Salado, Tramo IV Etapa II (subtramo B)	Roque Pérez, Buenos Aires	En ejecución	39.908	6,7%
5	Operación y mantenimiento 2022-2026 (INVAP)	B. de Irigoyen, Misiones	En ejecución	23.957	10,7%
6	Presa Nacimiento Río Senguer	Alto Río Senguer, Chubut	En ejecución	18.354	35,9%
7	Colector pluvial Av. Balbín	Gral. Rodríguez, Buenos Aires	Neutralizada	3.975	15,8%
8	Nueva toma Arroyo Buitreras y acueducto	Esquel, Chubut	En ejecución	2.470	2,4%
9	Desagües pluviales Av. Libertad	Marcos Paz, Buenos Aires	Rescindida	2.224	40,0%
10	Proyecto Larrea 2da etapa	Santa Fe, Santa Fe	Rescindida	1.900	6,5%
11	Infraestructura pluvial Islas Malvinas	Río Grande, Tierra del Fuego	Rescindida	1.255	0,0%
12	Desagües pluviales B° Don Orione	Florencio Varela, Buenos Aires	Rescindida	1.039	0,0%
13	Mejoramiento Canal El Molino	Esteban Echeverría, Buenos Aires	Rescindida	1.034	16,5%
14	Desagües pluviales B° Cruz Azul	La Matanza, Buenos Aires	Rescindida	1.000	s/d
15	Desagües pluviales B° Los Ceibos	La Matanza, Buenos Aires	Rescindida	878	64,0%
16	Canal de alivio sur Arroyo El Tejar	Monteros, Tucumán	Rescindida	847	s/d
17	Colector pluvial Av. Rivadavia y RP 200	Marcos Paz, Buenos Aires	Rescindida	842	0,0%
18	Entubamiento parcial Cuenca Salta	Colón, Entre Ríos	Rescindida	463	4,7%
19	Sumideros, conductos y cámaras	Exaltación de la Cruz, Buenos Aires	Finalizada	423	23,3%
20	Reemplazo alcantarillado Canal Río Muerto	Villa Ángela, Chaco	Rescindida	173	22,0%
21	Desagüe Canal Matriz El Badén	Alberdi, Tucumán	Rescindida	115	s/d
22	Readecuación Canales del Sudeste	Bandera, Santiago del Estero	Rescindida	105	25,0%
23	Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME)	Interprovincial	En ejecución	10.230	32,0%
24	Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y Nivológicas	Interprovincial	En ejecución	1.431	11,0%
Total				364.814	

Fuente: CEPA en base a SIPPE.


La ejecución del Fondo

Medidos en pesos de 2026, los ingresos del Fondo fueron de \$445.673 millones en 2022 y \$270.573 millones en 2023, años en los que el pago de obras superó lo recaudado (123% y 158%, respectivamente, con aplicación de saldos acumulados). **A**

partir de 2024 la relación se invierte: ese año ingresaron \$191.610 millones y se pagaron obras por apenas \$22.112 millones, es decir, el 12%. En 2025 la ejecución fue del 22% (\$57.777 millones sobre \$262.674 millones) y entre enero y mayo de 2026, del 39% (\$61.082 millones sobre \$157.383 millones).

En el acumulado de la gestión de Javier Milei (2024 a mayo de 2026), el Fondo recibió \$611.667 millones de pesos de 2026 y destinó a obras \$140.971 millones: **de cada 100 pesos que ingresaron, solo 23 se transformaron en obras.** En 2022 y 2023, en cambio, se pagaron obras por \$974.441 millones, más que lo recaudado en ese período.

Gráfico 1. Ingresos del FFIH y pago de obras. Período: 2022 – mayo 2026. En millones de pesos de 2026.

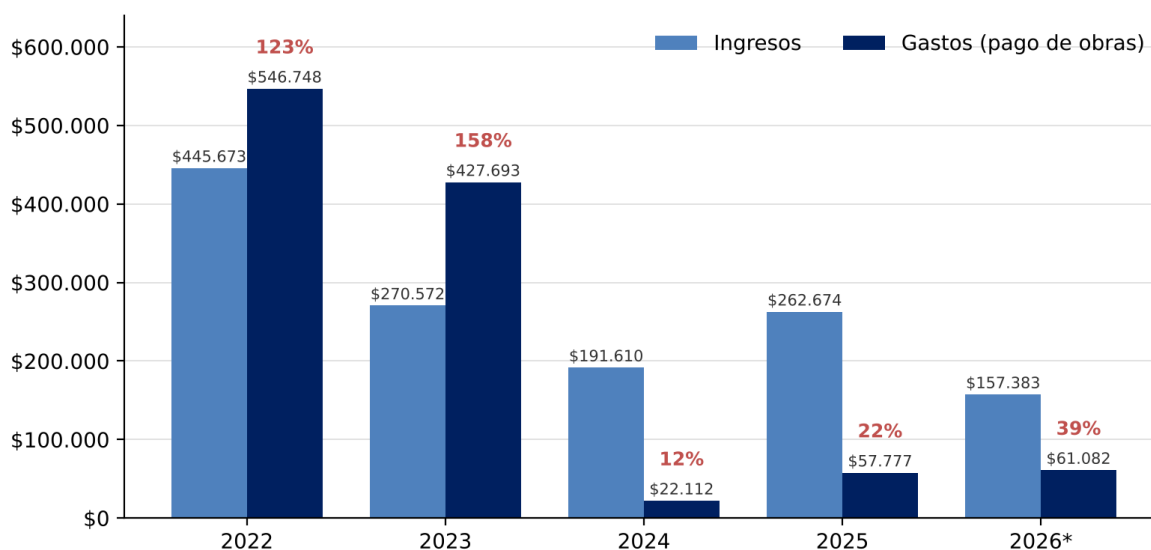

En rojo, ejecución: gastos en obras / ingresos. *2026: enero a mayo.


Fuente: CEPA en base a FFIH (Decreto 1381/01) e INDEC. *2026: enero a mayo.

La ejecución de cada obra

El grado de avance confirma la parálisis. De las 24 obras, 4 registran un avance nulo (entre ellas, el subtramo A del Río Salado, que figura en ejecución con 0%) y otras 3 no informan avance. Las obras más avanzadas fueron, paradójicamente, interrumpidas: **el Acueducto San Javier–Tostado quedó neutralizado con el 90% de la obra realizada**, los desagües del barrio Los Ceibos (La Matanza) se rescindieron con el 64% y los de la Av. Libertad (Marcos Paz), con el 40%.

Entre las 8 obras que siguen en ejecución, el avance máximo es de 35,9% (Presa Nacimiento Río Senguer, en Chubut). Los tres subtramos de la ampliación del Río Salado, que concentran el 45% del monto de toda la cartera, registran avances de 0%, 6,7% y 18,8%. Los sistemas de alerta temprana, clave frente a El Niño, avanzan lentamente: 32% el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos y 11% la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas.

Gráfico 2. Grado de avance de las obras del FFIH por provincia y estado. En porcentaje.

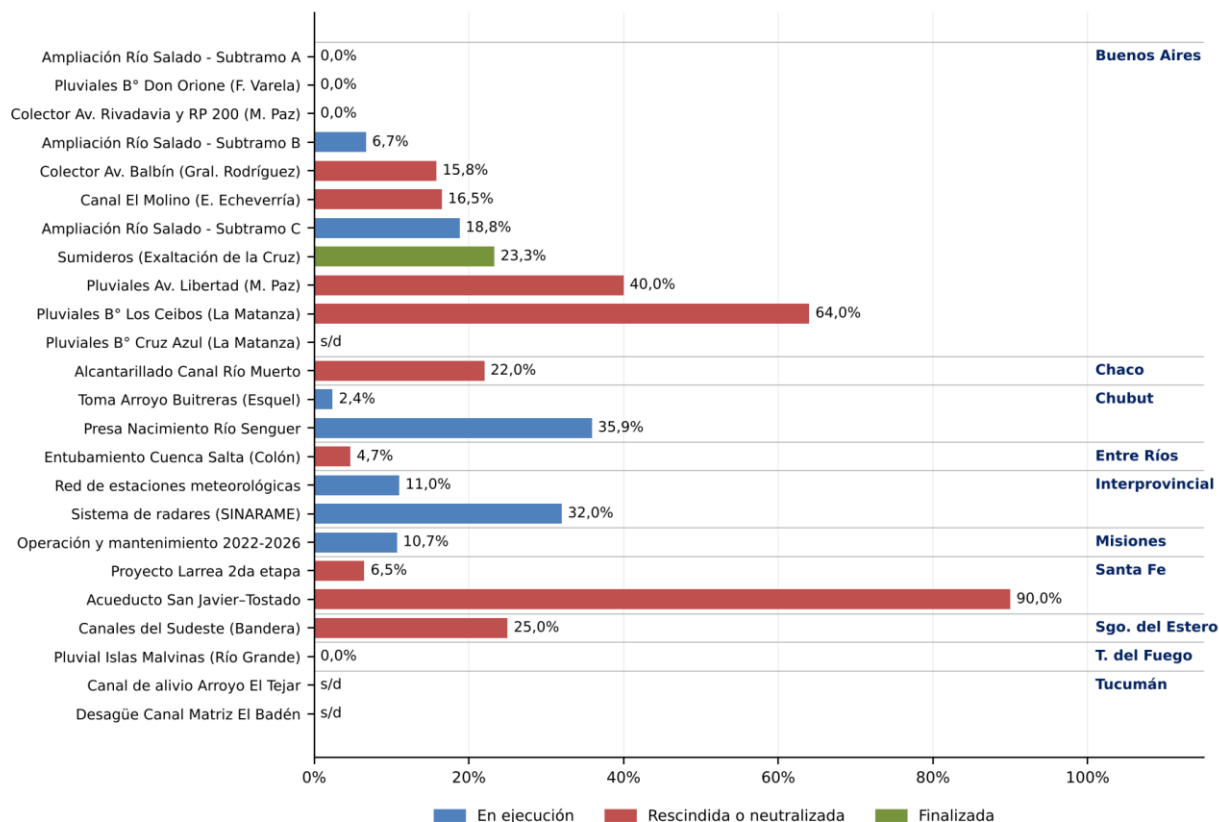

Fuente: CEPA en base a SIPPE.

¿Dónde está la plata?

Si los recursos no se destinan a obras, ¿dónde están? Al 1 de junio de 2026, el Fondo tenía **\$290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP)**, con vencimientos el 17 de julio y el 15 de septiembre de 2026, además de \$49.069 millones en cuentas a la vista y \$247 millones en plazos fijos. En total, \$339.993 millones: el 85,5% de los recursos disponibles estaba invertido en deuda del Tesoro.

El dato más elocuente surge del propio flujo del Fondo: **entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por las LECAP (\$59.747 millones) fueron prácticamente iguales a lo que se pagó por obras (\$61.082 millones)**. Es decir, el Fondo creado para financiar obras hídricas funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro. La normativa del FFIH no prevé que sus recursos se constituyan como inversión financiera.

Tabla 3. Destino de los recursos del FFIH. Datos al 1/6/2026. En millones de pesos.

Concepto	Vencimiento	Monto
LTN capitalizable en pesos (1)	17/7/2026	38.000
LTN capitalizable en pesos (2)	15/9/2026	252.676
Subtotal Letras del Tesoro		290.676
Saldos a la vista en cuentas del Fondo		49.069
Plazos fijos (reservas de liquidez)		247
Total		339.993

Fuente: CEPA en base a FFIH.

Las situaciones más graves frente a El Niño

El SMN pronostica para el trimestre octubre-diciembre de 2026 lluvias superiores a lo normal en el Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste de la provincia de Buenos Aires, y una tendencia a lluvias superiores en el centro-este bonaerense. En la provincia de Buenos Aires el punto de partida ya es crítico: según la Autoridad del Agua, al 14 de agosto las zonas centro, este y noreste presentaban suelos con humedad superior al 45%, técnicamente “completamente saturados”, y al cierre de julio 58 de los 92 municipios que reportan a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado su promedio de lluvias acumulado.

Al cruzar el pronóstico con el estado de las obras, aparecen seis situaciones de alta exposición. **La más urgente es la de Colón (Entre Ríos)**, donde el río Uruguay está en alerta (7,27 metros, con evacuación a partir de 7,90) y la obra de entubamiento de la Cuenca Salta se rescindió con apenas 4,7% de avance. En Santa Fe, el acueducto San Javier–Tostado quedó neutralizado con 90% de avance mientras la crecida del Paraná afecta a la capital; en los Bajos Submeridionales, una de las zonas que más se inundan con El Niño, las dos obras previstas fueron rescindidas; y en la cuenca del Salado, de llanura y con anegamientos prolongados, los tres subtramos avanzan entre 0% y 18,8%. En el conurbano, donde el riesgo son las tormentas intensas sobre desagües urbanos, 7 de las 8 obras están paralizadas.

Tabla 4. Obras del FFIH en zonas de mayor exposición a El Niño.

Región	Obras	Pronóstico de lluvias (SMN, oct-dic)	Exposición	Situación	Estado de las obras
Santa Fe	Acueducto San Javier–Tostado	Superior a lo normal	Alta	La crecida del Paraná afecta a la capital	Acueducto neutralizado con 90% de avance; Larrea con convenio rescindido
Entre Ríos, costa del Uruguay	Entubamiento Cuenca Salta	Superior a lo normal	Alta, afectada hoy	Río Uruguay en alerta en Colón (7,27 m; evacuación a 7,90 m)	Rescindida con 4,7% de avance
Bajos Submeridionales	Canal Río Muerto (Chaco); Canales del Sudeste (SDE)	Tendencia a superior a lo normal	Alta	De las zonas que más se inundan con El Niño	Ambas rescindidas
Cuenca del Salado	Tramo IV, Etapa II, subtramos A, B y C	Superior a lo normal en el oeste de PBA	Alta	Cuenca de llanura con anegamientos prolongados	En ejecución (avances de 0%, 6,7% y 18,8%)
Misiones	Mantenimiento INVAP	Superior a lo normal	Alta	Es mantenimiento, no una obra de defensa	En ejecución
Conurbano	Gral. Rodríguez, Marcos Paz, La Matanza, F. Varela, E. Echeverría, Exaltación	Tendencia a superior a lo normal en el centro-este de PBA	Media	Tormentas intensas sobre desagües urbanos	6 rescindidas, 1 neutralizada y 1 finalizada

Fuente: CEPA en base a SMN, SIPPE y medios provinciales.

El crédito del Banco Mundial que quedó sin efecto

El 9 de agosto de 2023 se aprobó el modelo de Contrato de Préstamo BIRF N.º 9516-AR con el Banco Mundial, por **USD 200 millones**, destinado a financiar el “Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas”. Se trataba, precisamente, del tipo de financiamiento necesario para anticiparse a eventos como el que hoy anticipa el SMN.

A más de tres años de su aprobación, la propia cartera de financiamiento internacional del Ministerio de Economía registra el préstamo con **0% de ejecución**. En junio de 2025, tras la inundación de Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que el crédito se transfiriera a la Provincia si la Nación no iba a utilizarlo. En octubre de 2026, la Provincia denunció que esos fondos no se destinaron a obras sino a financiar deuda del Estado.

El 14 de octubre de 2026 se conoció la contracara: **el Gobierno, a través del ministro Luis Caputo, negocia y reorienta líneas de financiamiento del Banco Mundial para destinar hasta USD 4.000 millones a minería, energía y minerales críticos**, además de movilizar hasta USD 10.000 millones junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) para proyectos de la economía real y el apoyo al RIGI. El financiamiento multilateral para prevenir inundaciones quedó, en los hechos, sin efecto.

A esto se suma el bloqueo de avales para créditos internacionales que gestiona la provincia de Buenos Aires: según el Gobierno bonaerense, la Nación mantiene

frenados USD 620 millones para obras críticas, entre ellas el túnel aliviador de la cuenca San Francisco-Las Piedras (USD 350 millones) y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital (USD 270 millones), mientras aprobó 18 créditos para otras 10 provincias por USD 1.973 millones.

En síntesis, frente a un fenómeno climático anticipado con meses de antelación, el Gobierno nacional rescindió o paralizó 15 de las 24 obras hídricas iniciadas, colocó el 85% de los recursos del Fondo en Letras del Tesoro y dejó sin usar un crédito del Banco Mundial pensado para inundaciones urbanas.
